ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1				
2	Contract Start / Signed	0 days	Wed 12/3/25	Wed 12/3/25
3	Kick off meeting	0.3 days	Thu 12/4/25	Thu 12/4/25
4	Input and technical clarification	0.3 days	Thu 12/4/25	Thu 12/4/25
5	Site survey and Assessment Report	0.3 days	Thu 12/4/25	Thu 12/4/25
6	**DI DỜI MÁY BID FILLER 2**	**2.4 weeks**	**Mon 12/8/25**	**Mon 12/22/25**
7	Hoc An Toàn và chuẩn bị lắp khung chử A	0.5 days	Mon 12/8/25	Mon 12/8/25
8	Tháo ống và ràng buộc chặc các BP quan trọng của máy	0.5 days	Mon 12/8/25	Mon 12/8/25
9	Tháo & Di chuyển máy đến vị trí mới	1 day	Tue 12/9/25	Tue 12/9/25
10	Lắp máy tại vị trí mới	1 day	Wed 12/10/25	Wed 12/10/25
11	Chuẩn bị & chế tạo & hàn đính ống sản phẩm từ A-tank3 đến van P104 của BIB2 vị trí mới	1 day	Mon 12/8/25	Tue 12/9/25
12	Hàn thật ống sản phẩm từ A-tank3 đến van P104 của BIB2 vị trí mới	3 days	Tue 12/9/25	Fri 12/12/25
13	Chuẩn bị & chế tạo & hàn đính ống sản phẩm từ van P104 của BIB2 vị trí mới về endvalve	1 day	Mon 12/8/25	Tue 12/9/25
14	Hàn thật ống sản phẩm từ van P104 của BIB2 vị trí mới về endvalve	3 days	Tue 12/9/25	Fri 12/12/25
15	Chuẩn bị & chế tạo & hàn đính ống CIP suply đến BIB2 vị trí mới	1 day	Sat 12/13/25	Sat 12/13/25
16	Hàn thật ống CIP suply đến BIB2 vị trí mới	3 days	Mon 12/15/25	Wed 12/17/25
17	Chuẩn bị & chế tạo & hàn đính CIP return từ BIB2 về điểm return cũ	1 day	Mon 12/8/25	Tue 12/9/25
18	Hàn thật ống CIP return từ BIB2 về điểm return cũ	3 days	Tue 12/9/25	Fri 12/12/25
19	Chế tạo và lắp bệ đỡ ống	2 days	Tue 12/9/25	Thu 12/11/25
20	Chụp X-ray mối hàn	1 day	Sat 12/13/25	Sat 12/13/25
21	Chuẩn bị & chế tạo & hàn đính ống hơi	0.5 days	Mon 12/15/25	Mon 12/15/25
22	Hàn thật ống hơi	1 day	Mon 12/15/25	Tue 12/16/25
23	Bọc cách nhiệt nóng	2 days	Wed 12/17/25	Fri 12/19/25
24	Chuẩn bị & chế tạo & hàn đính ống khí nén	0.5 days	Mon 12/15/25	Mon 12/15/25
25	Hàn thật ống khí nén	1 day	Tue 12/16/25	Tue 12/16/25
26	Chuẩn bị & chế tạo & hàn đính ống RO	0.5 days	Mon 12/15/25	Mon 12/15/25
27	Hàn thật ống RO	1 day	Mon 12/15/25	Tue 12/16/25
28	Lắp máng cáp & Kéo dây điện	1 day	Wed 12/10/25	Wed 12/10/25
29	Đấu nối điện	1 day	Thu 12/11/25	Thu 12/11/25
30	Passvitation ống	1 day	Tue 12/16/25	Wed 12/17/25
31	Vệ sinh & Chạy thử & bàn giao	1 day	Thu 12/18/25	Fri 12/19/25
32	**DI DỜI MÁY BID FILLER 1**	**0.5 weeks**	**Thu 12/25/25**	**Mon 12/29/25**
33	Hoc An Toàn và chuẩn bị lắp khung chử A	0.5 days	Thu 12/25/25	Thu 12/25/25
34	Tháo ống và ràng buộc chặc các BP quan trọng của máy	0.5 days	Fri 12/26/25	Fri 12/26/25
35	Tháo & Di chuyển máy đến vị trí chỉ định	1 day	Sat 12/27/25	Sat 12/27/25

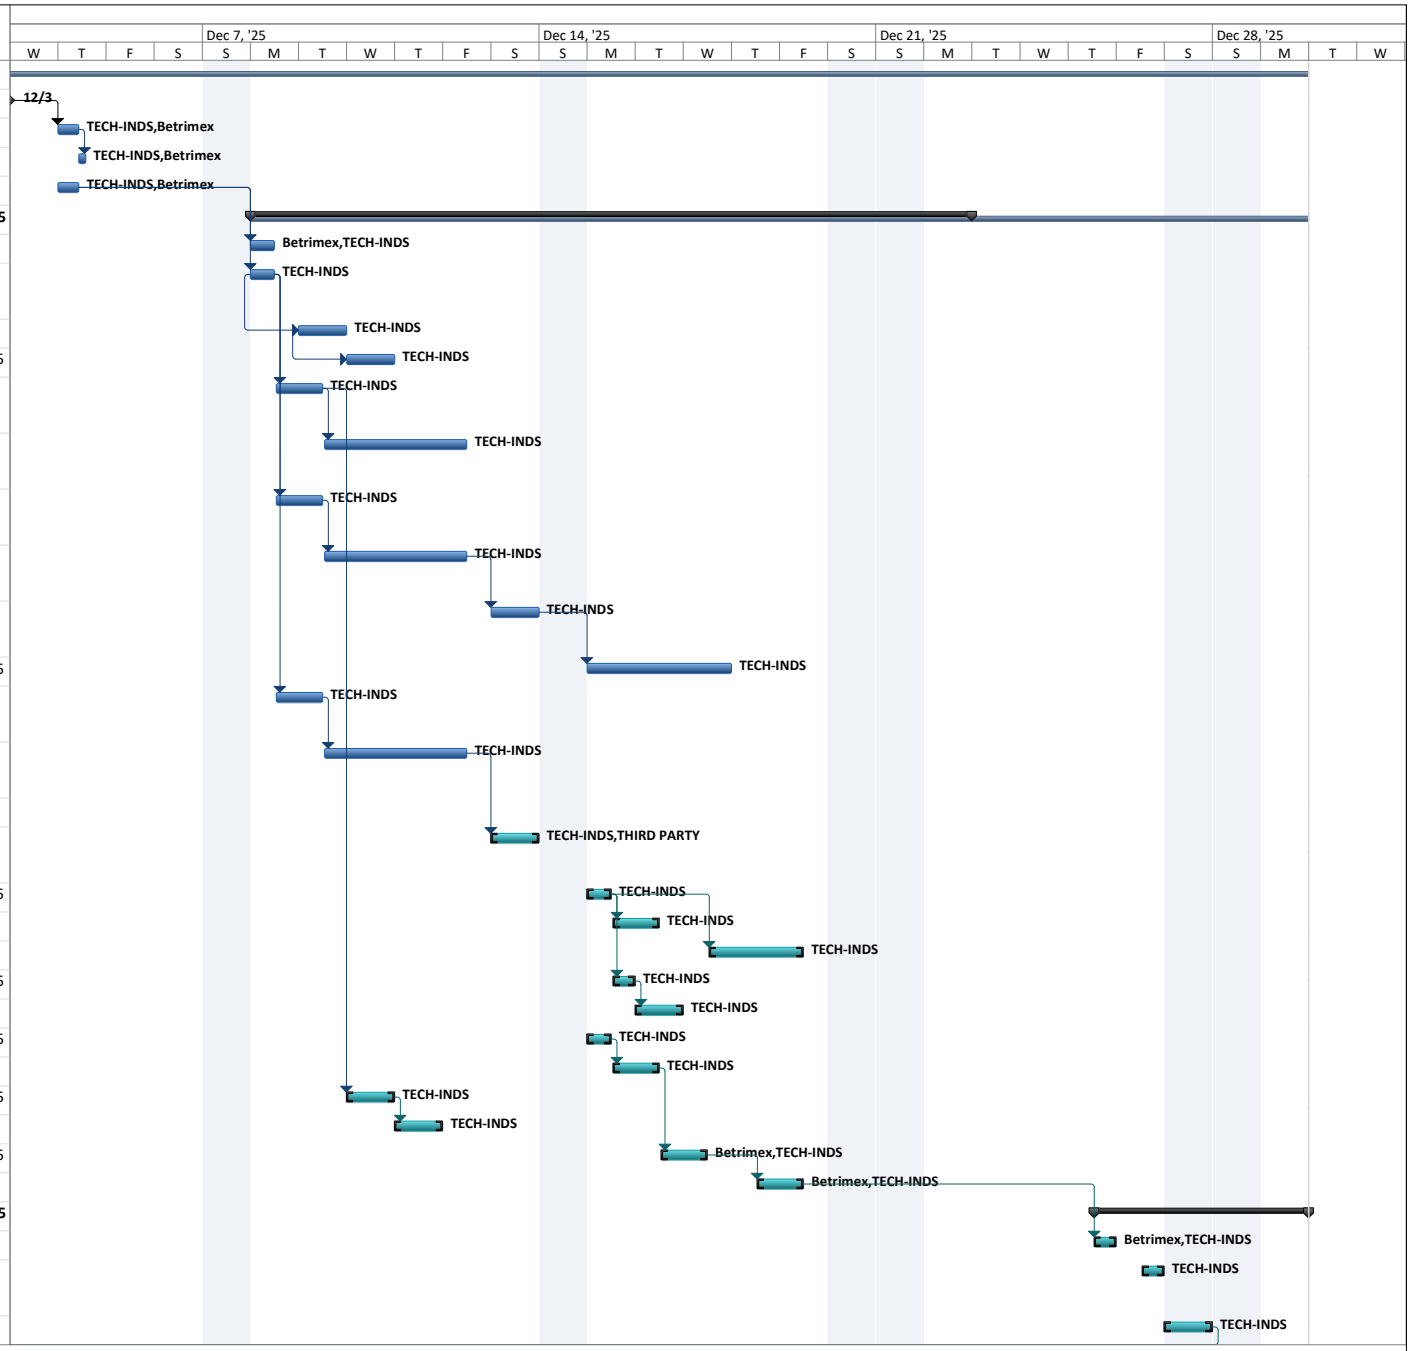

Project: BIEN HOA-HENKEL-VN-PU
Date: Tue 11/25/25

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only							
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline							
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Progress							
